

# Neubau Sporthalle Brombach

## 10. Quartalsbericht Juli 2019

OR Brombach – 02. Juli 2019

AUT - 04. Juli 2019




# Bautenstand Halle



Die Zimmererarbeiten wurden im März 2019 abgeschlossen

# Bautenstand Halle

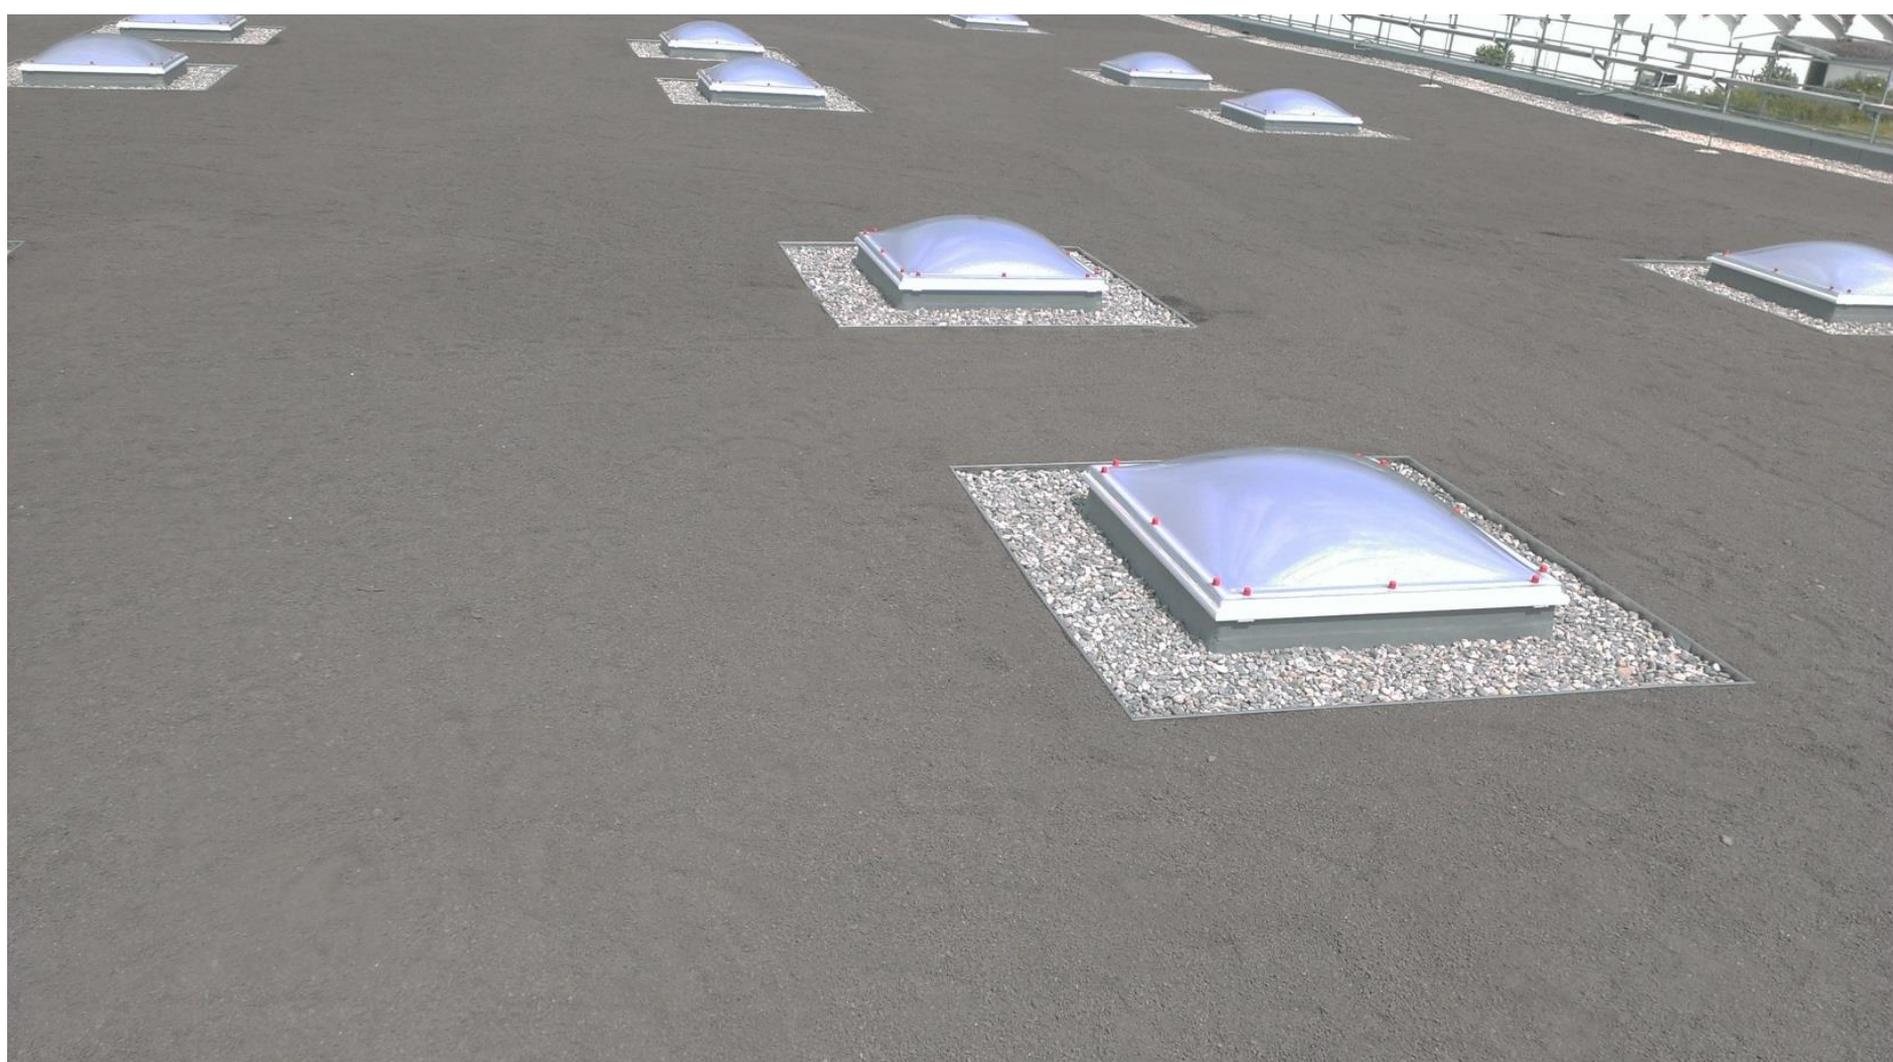


Die Dachabdichtungsarbeiten wurden im Juni 2019 abgeschlossen

# Planungsstand Halle



Rohinstallation Haustechnische Gewerke

# Planungsstand Halle

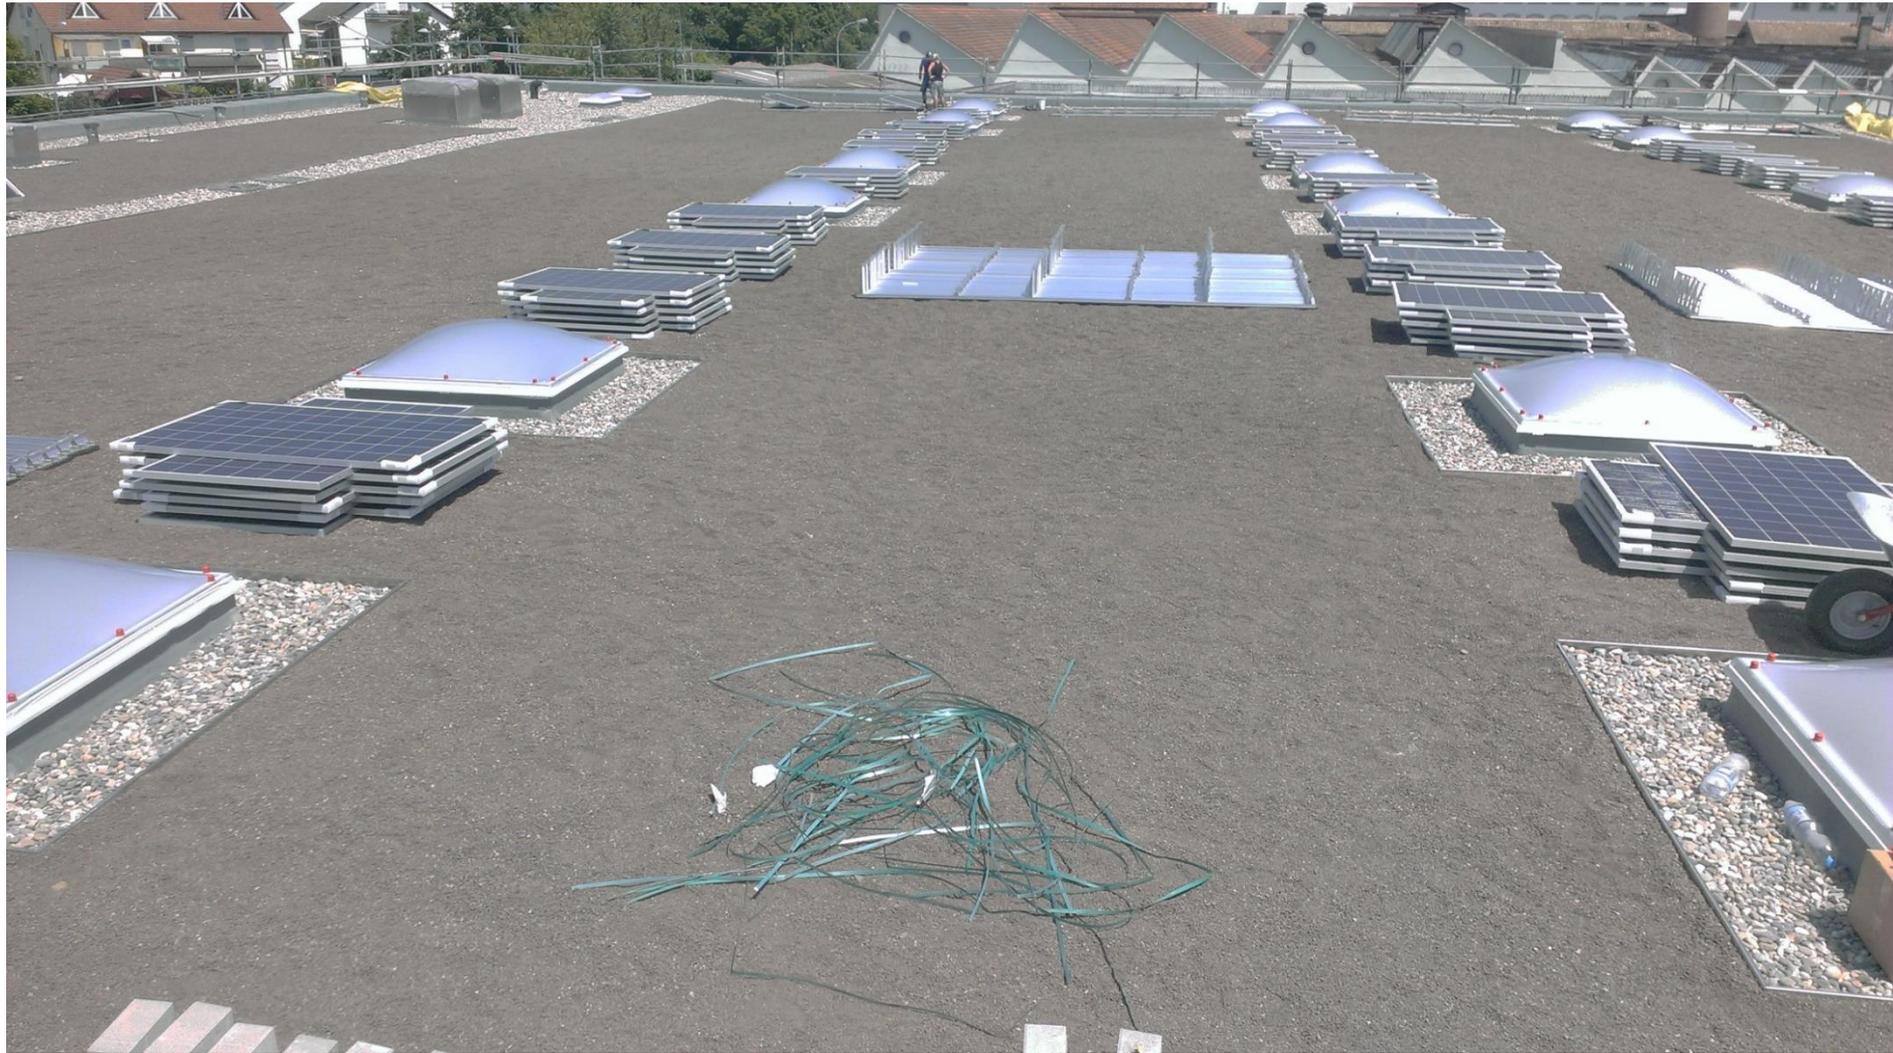

Montage PV-Anlage

# Planungsstand Halle



Fassadenarbeiten

April 2019: Beginn der Rohinstallation der haustechnischen Gewerke

Mai 2019: Blitzschutzanlage, Aufzugsanlage und Jalousien fertiggestellt,  
Fassadenarbeiten begonnen

Juni 2019: Beginn der Installation der PV-Anlage, Solaranlage ist montiert

Mittlerweile sind 28 Gewerke beauftragt, was einem Beauftragungsstand von 95% entspricht

Zeitverzug ca. 6 Wochen gegenüber dem ursprünglichen Terminplan.

Genehmigte Kosten - 9.000.000 €

Kostenanschlag liegt derzeit bei 9.387.000 €

→ verschiedene Nachträge im Bereich Rohbau, Zimmermann und Dachdeckung

Kostenerhöhung ca. 11,7 % gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2016

Der Hallenbauförderverein übernimmt davon Ausstattung und Einrichtung in Höhe von ca. 175.000 € (z.B. Lautsprecheranlage, Spielstandsanzeige, Ausbau Übungsraum, Sonder-Küchenausstattung)

# Termine Halle




Das Richtfest fand am 20. März 2019 statt.

Baufertigstellung Frühjahr 2020

Die Inbetriebnahme ist für April 2020 geplant

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

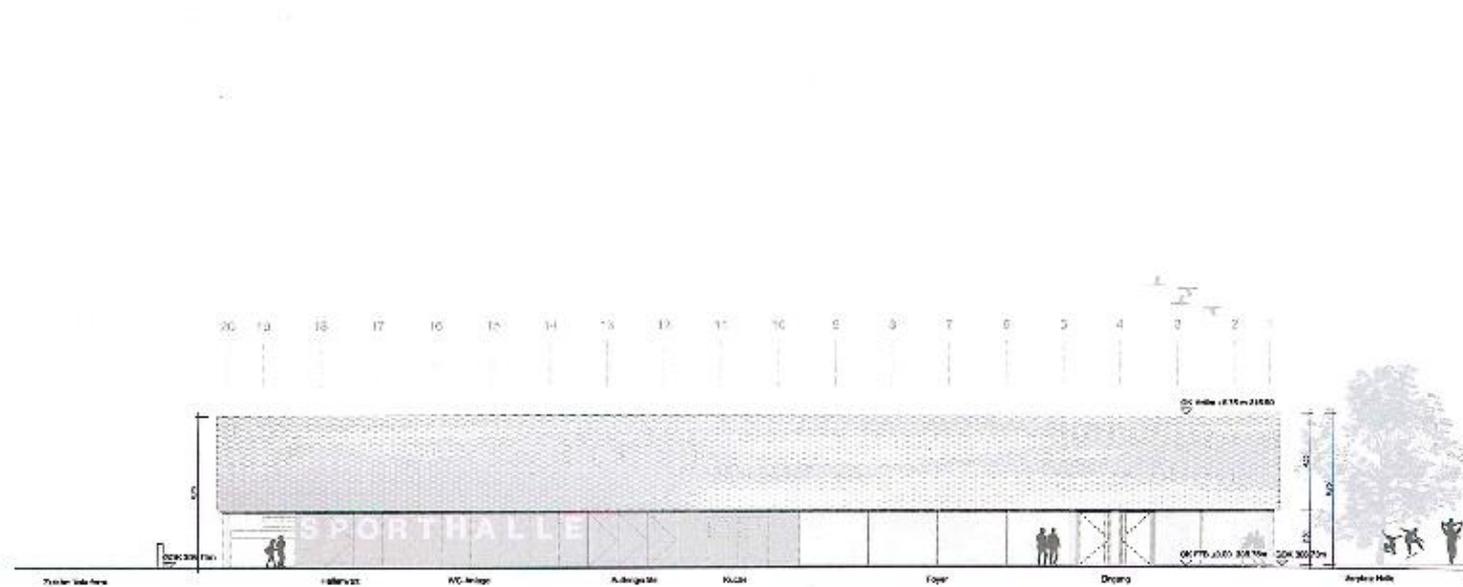

Neubau Sporthalle Brombach Lörrach

Ansicht Nord
