

7. Sachstandsbericht

Straßenbaumaßnahmen Zentralklinikum

Fachbereich Tiefbau

Beschlussvorlage 150/2022

13. September 2022

OR Brombach & Hauingen

15. September 2022

AUT


Übersicht Bauabschnitte

- Bauabschnitt 1** Verlegung L138 West mit Kreisverkehrsplatz (Stadt Lörrach) ✓
- Bauabschnitt 1A** Herstellung Retentionsfläche (Stadt Lörrach) ✓
- Bauabschnitt 1B** Ertüchtigung Knotenpunkt Entenbad/B317 (RP Freiburg, Planungsvereinbarung mit Stadt Lörrach) ✓
- Bauabschnitt 2** Verlegung L138 zwischen Zentralklinikum und Steinen (RP Freiburg)
- Bauabschnitt 3** Vollanschluss L138/B317 mit Unterführung Bahnlinie (RP Freiburg, Planungsvereinbarung mit Stadt Lörrach)
- Bauabschnitt 4** Wegeverbindung nach Hauingen (Stadt Lörrach)


Bauabschnitt 2

Verlegung L 138 zwischen Zentralklinikum und Steinen

- Planung und Bau durch RP Freiburg
- Abfahrt mit Abbiegespur für einen möglichen P+R-Parkplatz wird in der Planung berücksichtigt. Haushaltsmittel für Planung in Höhe von 30.000 € in 2021 und 30.000 € in 2022 sind eingestellt.

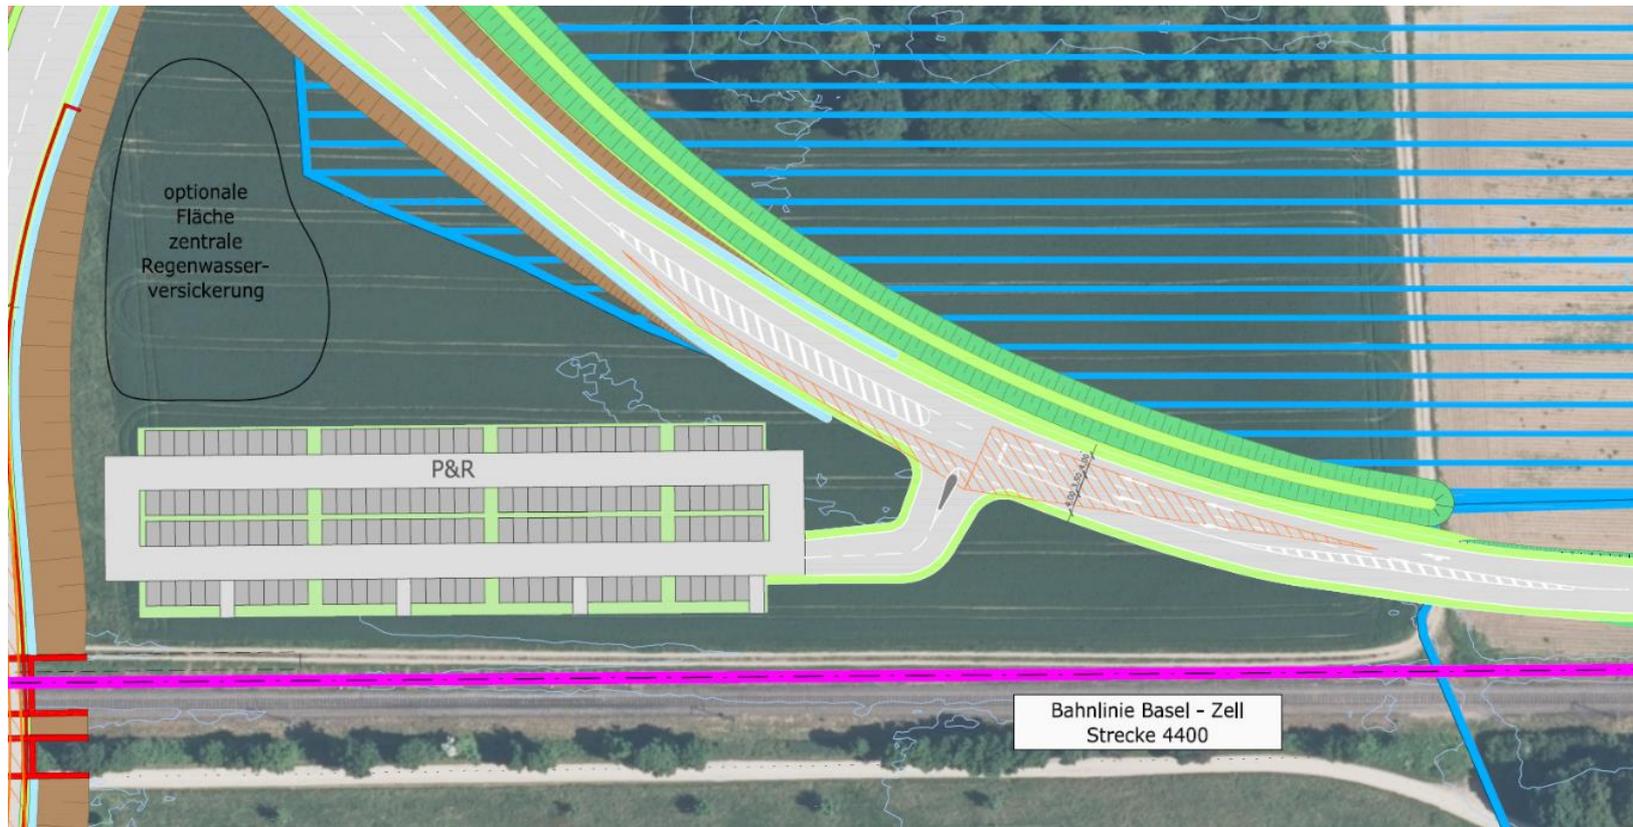

Bauabschnitt 3 – Vollanschluss L138/B317

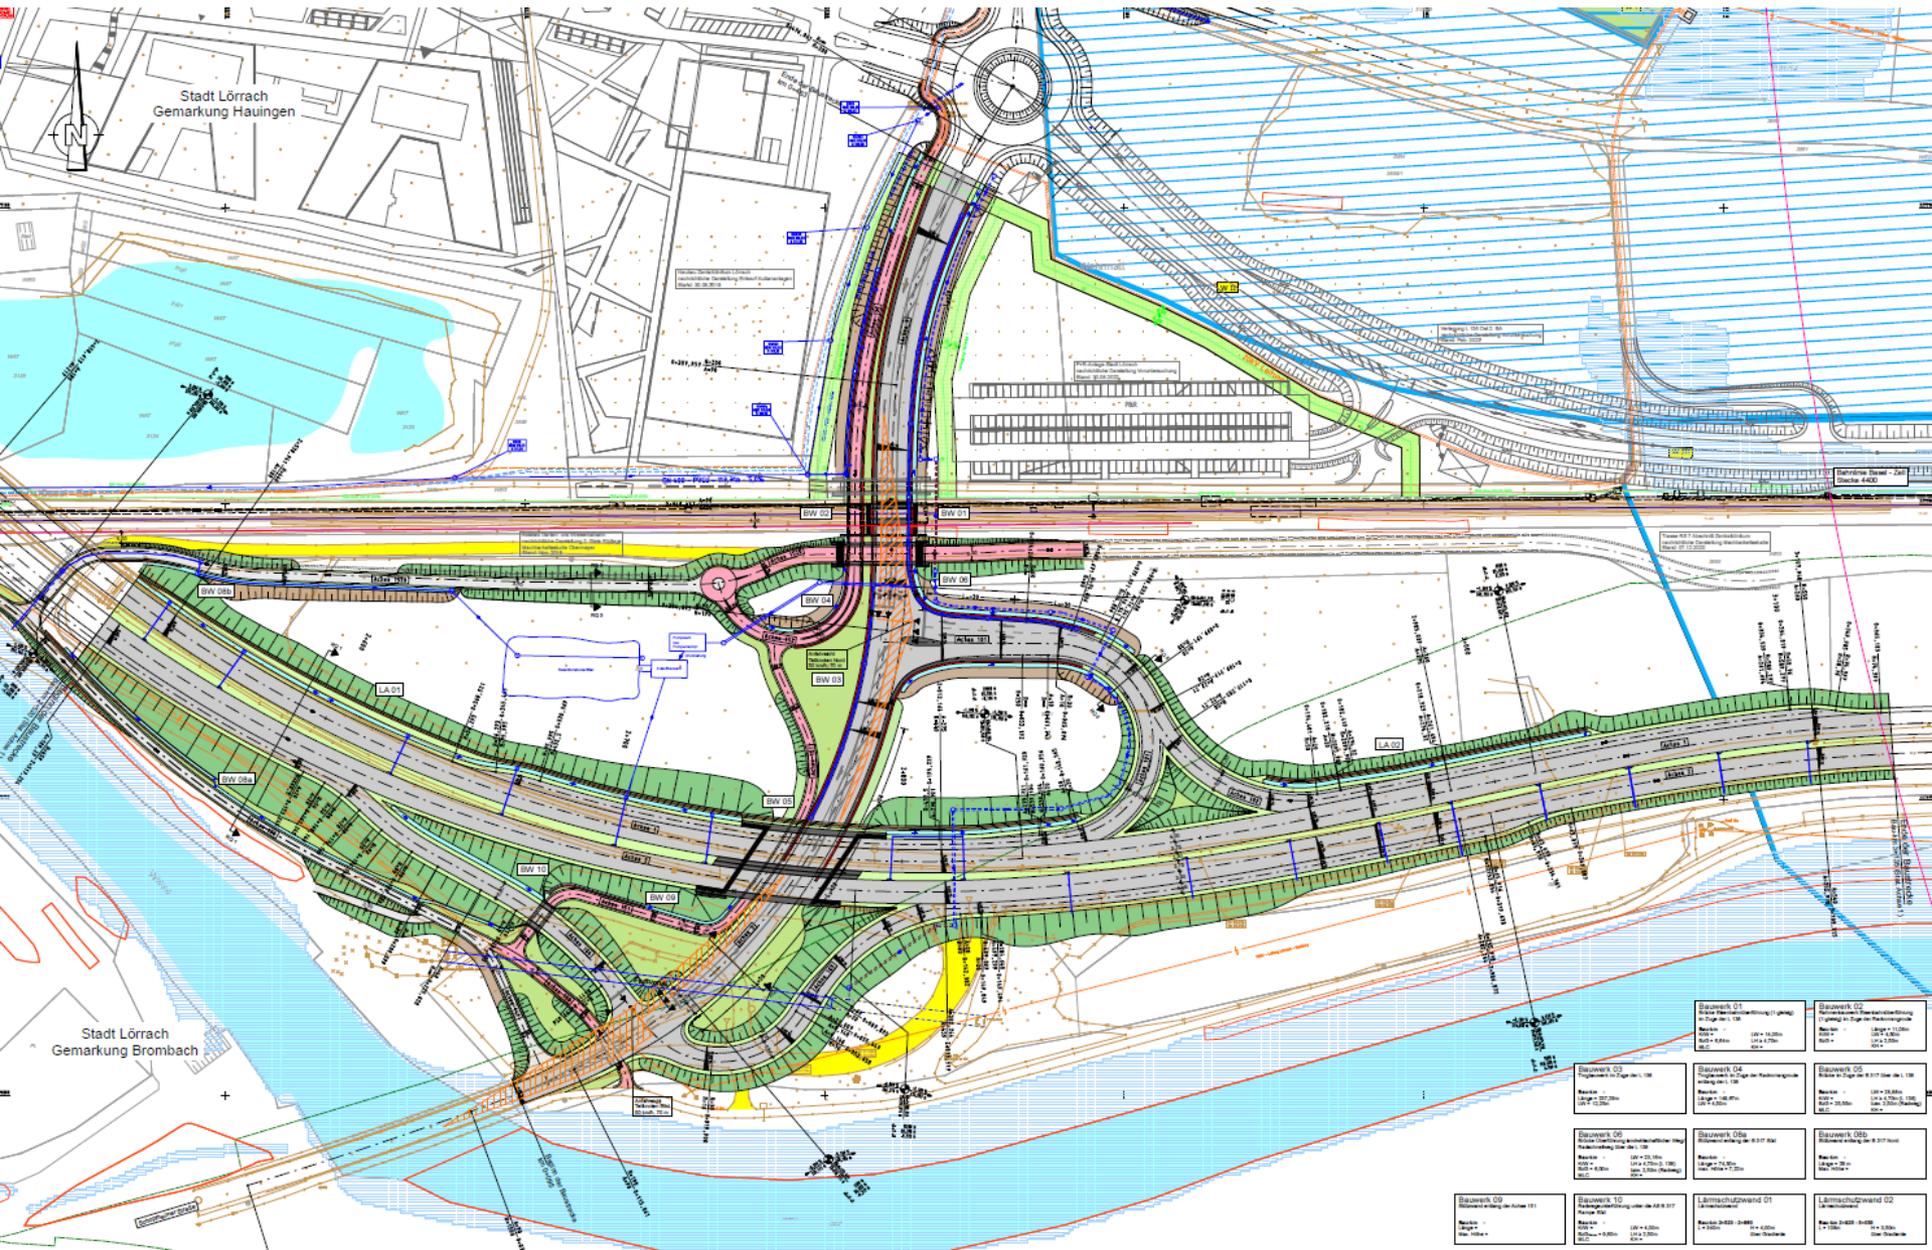

Schwerpunkte der aktuellen Planungen

- Ingenieurbauwerke
→ Abstimmungstermin mit RP Freiburg 28. Juli 2022
- Entwässerung Trogbauwerk
- Neubau Fluttunnel parallel zur Wiese
- Lärmschutzwände
- Lichtsignalanlagen
- Durchführung des Sicherheitsaudits

Fachgutachten

- Verkehrsgutachten ✓
- Hydrogeologische Untersuchungen ✓
- Geologisches Gutachten ✓
- Schalltechnische Untersuchung ✓
- Umweltgutachten → Abstimmungstermin 20. Juli 2022



Weiteres Vorgehen

- Fertigstellung Vorentwurf bis Ende September/Anfang Oktober 2022
- Prüfung des Vorentwurfs durch Verkehrsministerien Land & Bund
- Einarbeitung der Hinweise und Anregungen
- Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens

Bauabschnitt 4 – Wegeverbindung nach Hauingen

- Weiterführung des neuen straßenbegleitenden Geh- und Radwegs vom Zentralklinikum nach Hauingen
- Verkehrsberuhigung am Ortseingang durch eine Verkehrsinsel mit Querungshilfe
- Finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 € für die Planungen sind im HH vorhanden
- Einstieg in die Planungen nach Abschluss der Vorentwurfsplanung zum 3. Bauabschnitt
- Flugroute der Fledermäuse entlang des Steinenbachs ist zu berücksichtigen

