

1. Sachstandsbericht Umlegung L138


Klaus Dullisch/Stefan Weber
FB Straßen/Verkehr/Sicherheit

3. März 2020 – OR Hauingen, Brombach
5. März 2020 - AUT



Lössrach

Umlegung L 138

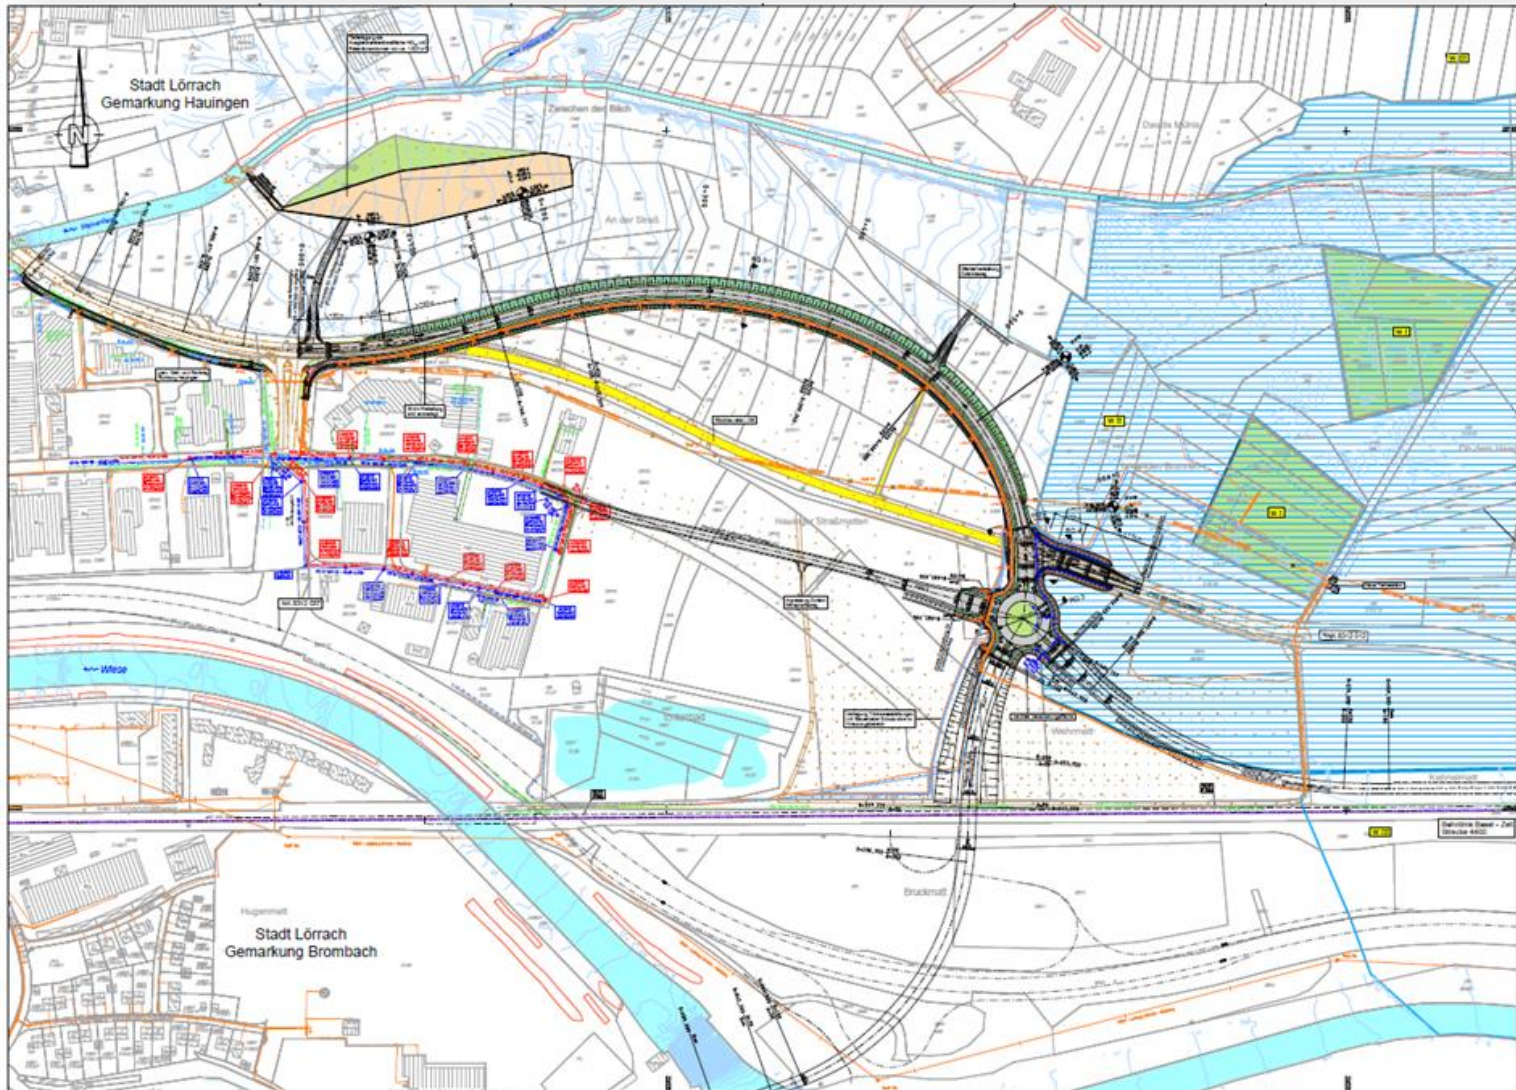

Lörrach

Umlegung L 138

- Auftragsvergabe durch den Gemeinderat am Donnerstag, den 19.12.2019 an die ARGE Schleith/Oskar Vogel
- Baubeginn am Montag, den 13. Januar 2020
- Spatenstich am Montag, den 20. Januar 2020
- Baufertigstellung Ende Juli 2020



Umlegung L 138

Stand 30.01.2020



Provisorische Baustraße

Verlegung Wasserversorgungsleitungen



Umlegung L 138

Stand 27.02.2020



Provisorische Baustraße

Erdarbeiten Kreisverkehr



Umlegung L 138

Stand 27.02.2020



Versickerungsfläche

Straßenentwässerung



Bautätigkeiten im Januar/Februar 2020

- Allgemeine Rodungsarbeiten/Flächenräumung
- Verlegung der Wasserversorgungsleitungen
- Herstellung der Baustraße
- Abtrag Erdbodenmaterial im Bereich des Kreisverkehrs
- Oberbodenabtrag neue Trasse L 138

Arbeitsschritte ab März 2020

- Fertigstellung der Wasserleitungen und Umschluss an Bestandsleitungen
- Fertigstellung der Baustraße und Herstellung des Kreisels
- Herstellung Retentionsfläche
- Ausbau Geh- und Radweg Abschnitt „West“ Richtung Hauingen

Regelmäßige Treffen/Projektbeteiligten

➤ **Regelmäßige Jour Fixe (Donnerstags 13:30 Uhr)**

➤ **Teilnehmer**

- Büro Rapp Regioplan
 - Herr Benz, Herr Kutsche
- Baufirma Schleith
 - Frau Pellegrino, Herr Schneider
- Baufirma Oskar Vogel
 - Herr Meier
- Stadt Lörrach – Fachbereich SVS
 - Herr Dullisch, Herr Weber

➤ **Zusätzliche Projektbeteiligte**

- h.i Consult, Frau Hug
- ö:konzept, Herr Ullrich
- HPC, Herr Steckermeier, Herr Suttikus
- Dplan, Herr Dobrinski

Ertüchtigung des bestehenden Knotens Entenbad



Ertüchtigung Knotenpunkt Entenbad


- Aufweitung der Fahrbahn auf zwei Spuren in Richtung Lörrach
- Provisorische Lichtsignalanlage wird erstellt
- Beschleunigungsspur von der Querspange in Richtung Lörrach
- Technische Planungsbearbeitung durch Büro Rapp Regioplan
- Umweltgutachten wird gerade erstellt
- Grundstücke gehören Stadt Lörrach und dem Bund
- Eine Bauliche Umsetzung kann voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen

Vollanschluss B 317 an L 138

(3. Bauabschnitt)



Lageplan 3. Bauabschnitt Vollanschluss B 317 an L 138

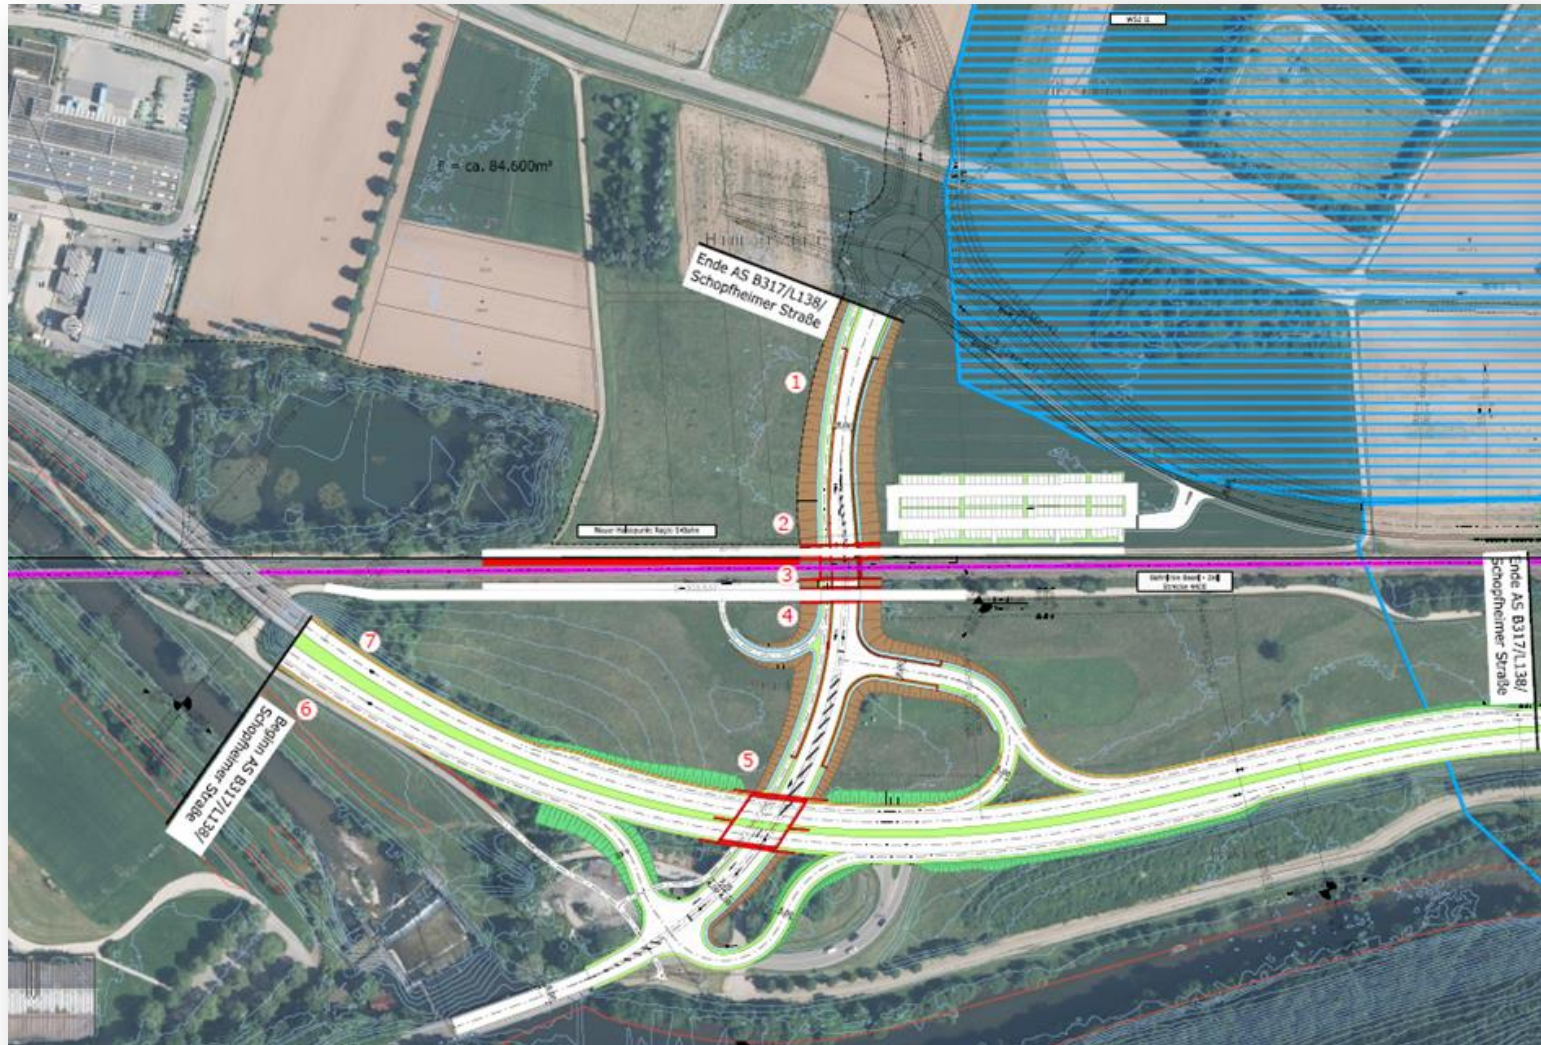



Deckensanierung B 317

Herbst 2020

Bereich Hasenloch-Entenbad



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
